Année universitaire			
Département	**Informatique**	**Année**	**3A**
Matière	**Méthodes agiles**		
Enseignant	**F Perraud**		
Intitulé TD/TP :	**TP - TT**		

Une bibliothèque dans un village du Massif Central souhaite s'équiper d'une nouvelle application informatique afin de répondre à différents besoins.
La solution proposée devra dans un 1er temps :

- Permettre aux lecteurs de consulter la liste des ouvrages proposés avec leur emplacement et réserver un ouvrage
- Permettre au gestionnaire de la bibliothèque de gérer les inscriptions des usagers, enregistrer les prêts et les retours, consulter les réservations

La bibliothèque disposera de 2 terminaux, le 1er pour les gestionnaires et le 2ème à disposition des lecteurs.

Vous venez d'être embauchés par une ESN dans lequel tous les projets sont gérés avec la méthode Scrum. Le projet pour cette bibliothèque vous est confié sur votre période d'essai. Vous êtes réparties en plusieurs équipes concurrentes. Votre période d'essai sera validé ou non à l'issu de ce projet.

Objectif : Répondre au besoin client en mettant en œuvre la méthodologie Scrum.
Votre budget : 5 séances de 1h30

Les éléments suivants seront mis en œuvre au fur et à mesure.

- Répartition des rôles
- Définition des users stories et des tâches
- Réunion bac à sable
- Réunion affinage
- Planification de sprint
- Tableau Kanban
- Réunion quotidienne (en début de chaque séance)
- Réalisation de l'application
- Burndown Chart
- Démonstration de fin de sprint
- Rétrospective de sprint

Vous réaliserez 2 sprints sur l'ensemble des séances.

Rappel :

Les users stories passent par différentes étapes avant d'être choisies pour être réalisées dans un sprint.

- Bac à sable
  - Antichambre du backlog
  - Toutes les propositions du Product Owner, des parties prenantes, de l'équipe, sont déposées dans ce bac : idée, nouvelle story…
  - Les propositions sont étudiées par le PO et l'équipe
  - Puis le PO transfert certaines dans le bac d'affinage lors de la réunion bac à sable
- Bac d'affinage
  - Entrée : stories du bac à sable traitées lors de la réunion bac à sable
  - Le PO ordonne les stories
  - L'équipe les estime – planning pocker – lors de la réunion d'affinage
  - Toute l'équipe affinent les stories
  - Sortie : stories dans le bac prêt
- Bac des stories prêtes
  - Contient les stories prêtes pour le prochain sprint
- Bac des stories du sprint (bac des stories à faire)

La **réunion de planification de sprint** permet de définir les tâches qui seront réalisées pendant le sprint. L'ensemble de l'équipe participe à cette réunion. Le Product Owner priorise les users stories prêtes. L'équipe de développement décide des users stories qui seront réalisées pendant le sprint. Une user story a une durée d'environ 1 jour en théorie.

Le **Burndown chart** ou BDC (en français, graphique d'avancement) de sprint est un **graphique représentant le reste à faire dans un sprint**. Il est actualisé tous les jours et montre la tendance dans l'avancé du sprint.

- Ex :

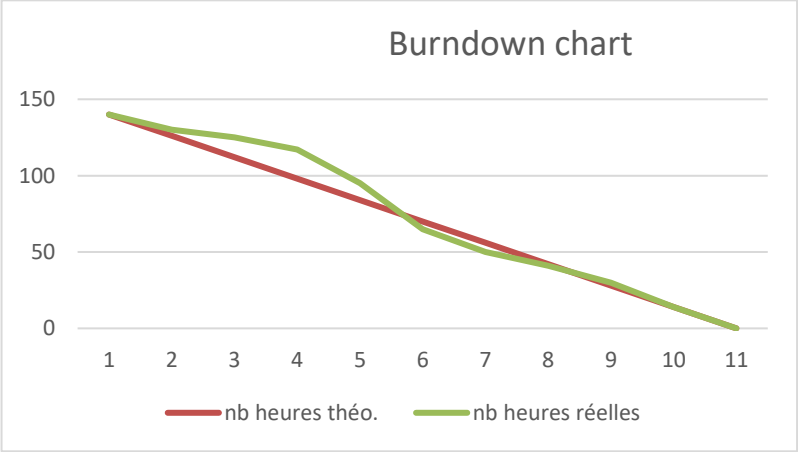

- L'axe vertical représente les heures théoriques et réelles, l'axe horizontal les heures

Travail à faire :
Après avoir réparti les rôles entre vous (SM, PO, équipe développement…), vous allez alimenter successivement le bac à sable, le bac d'affinage, le bac Prêt et le bac à faire. Les « histoires » seront précisées progressivement.

Vous allez créer un tableau Kanban avec Git ou autre. Vous me ferez des copies d'écran au fur et à mesure.
Votre tableau contiendra les colonnes suivantes :

- Bac à sable
- Affinage
- Prêt
- A faire
- En cours
- Terminé

Déroulement :

- Noter toutes vos **idées** de stories (entre 10 et 15) dans la colonne « bac à sable » du tableau. Faites une copie d'écran.
- Organiser une **réunion « bac à sable »** pour clarifier vos idées et stories présentent dans « le bac à sable » et choisir les éléments (Entre 8 et 10) qui rejoindront le bac (ou colonne) « d'affinage ». Faites une copie d'écran
- Organiser la **réunion d'affinage**. Certaines stories seront peut-être décomposées en stories plus petites.
    - Utiliser le tableau avec toutes vos stories (entre 5 et 8) que vous allez ordonner et compléter au fur et à mesure de l'affinage : nom de la story – description (en tant que … je veux …. afin de…) - la tâche sera terminée quand… Vous pouvez créer un tableau Excel reprenant le détail des stories
    - Organiser un Planning Poker pour estimer le nombre de points des users stories. Des solutions sont disponibles sur internet pour effectuer le « planning poker ».
    - Alimenter enfin le bac « prêt » avec les users stories chiffrées. Faites une copie d'écran
- Réaliser ensuite la **planification de votre 1er sprint.** Vous allez choisir dans le bac « Prêt » un certain nombre d'histoires (users stories) (environ 5 histoires) que vous décomposerez en tâches. Vous alimenterez ensuite votre bac « à faire » dans le sprint.
- Développer le contenu du 1er sprint
- Construire le **Burdown chart théorique** de la réalisation de votre application
- A la fin du sprint, présenter votre solution au client (démonstration)
- Organiser une rétrospective de sprint.
- **2ème sprint**…
- …

Rem :

Faites bien une copie d'écran de votre tableau à chaque étape

Rendu :

Au cours de ce TP-TT, vous rédigerez un **compte rendu**.

Ce compte rendu comportera au minimum une 1ère page avec les noms des personnes de votre groupe, un titre, puis une introduction, les décisions prises pendant les différentes réunions, une copie du Tableau Kanban à chaque étape, le tableau Excel, le Burndown chart (graphique d'avancement), une conclusion. Vous préciserez les difficultés que vous avez rencontrées…

Le compte rendu final sera mis sur **Moodle,** dans le **dossier** créé pour le TP-TT avant le **Mercredi 4 Février 2026 23h**. Il est cependant préférable de terminer le plus rapidement possible. Le nom de votre rapport (format **pdf – un seul fichier**) doit être explicite : **TT_AGILE_groupeAgile.** Vous déposerez aussi une **version intermédiaire** du compte rendu à la fin de chaque semaine sur Moodle.

La dernière séance sera dédiée aux présentations de vos solutions.

Les groupes ont été constitués par votre entreprise. Les personnes absentes (injustifiées) au TP ou ne s'investissant pas dans le projet seront pénalisées.
